

# Phase 1

Durée des travaux : 12 mois

Mars 2022 – Février 2023



- Réalisation des voies d'accès et murs de soutènements,
- Travaux locaux sociaux,
- Création du giratoire d'accès déchèterie projet,
- Travaux parc à bennes et déchèterie provisoire.



## Phase 2a

Durée des travaux : 3 mois

Mars 2023 – Mai 2023



- Mise en service de la déchèterie provisoire,
- Déconstruction de la déchèterie existante,
- Travaux voie d'accès.



## Phase 2b

Durée des travaux : 8 mois  
Juin 2023 – Janvier 2024




- Travaux station de transfert.



## Phase 2c

Durée des travaux : 1 mois

Février 2024

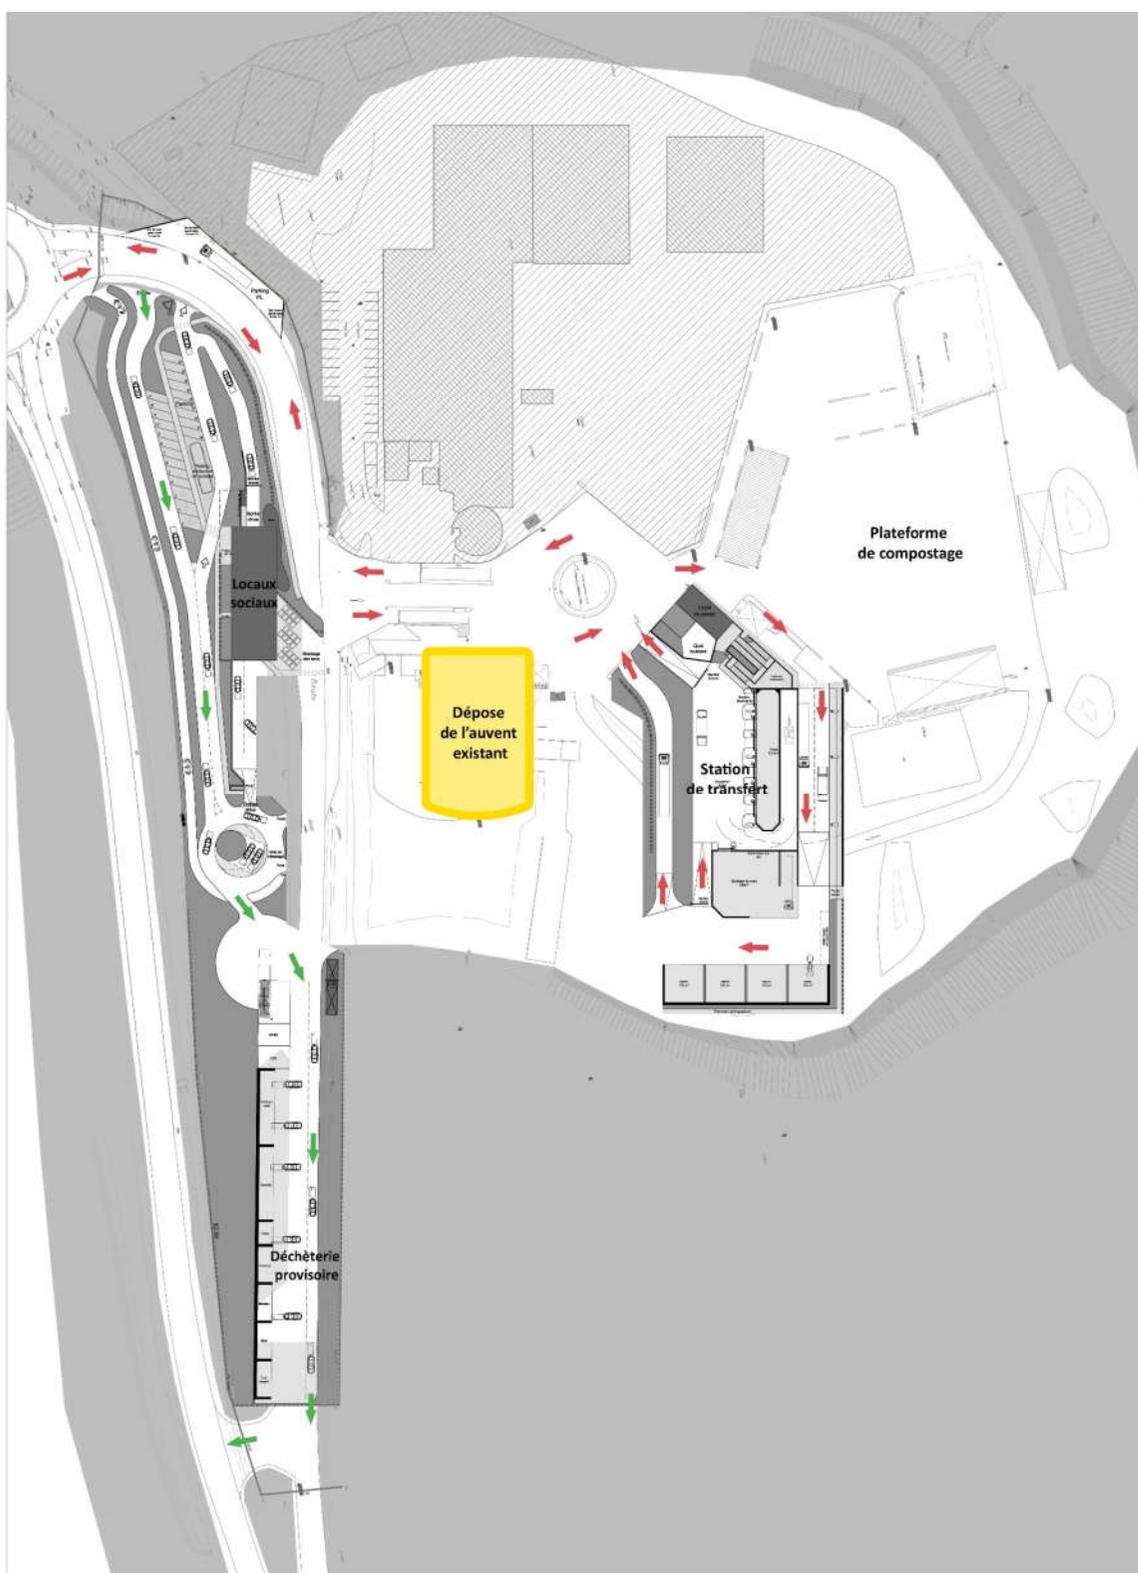


- Fermeture de la station de transfert existant,
- Mise en service de la station de transfert projet,
- Dépose de l'auvent existant de la station de transfert.



## Phase 2d

Durée des travaux : 2 mois

Mars 2024 – Avril 2024

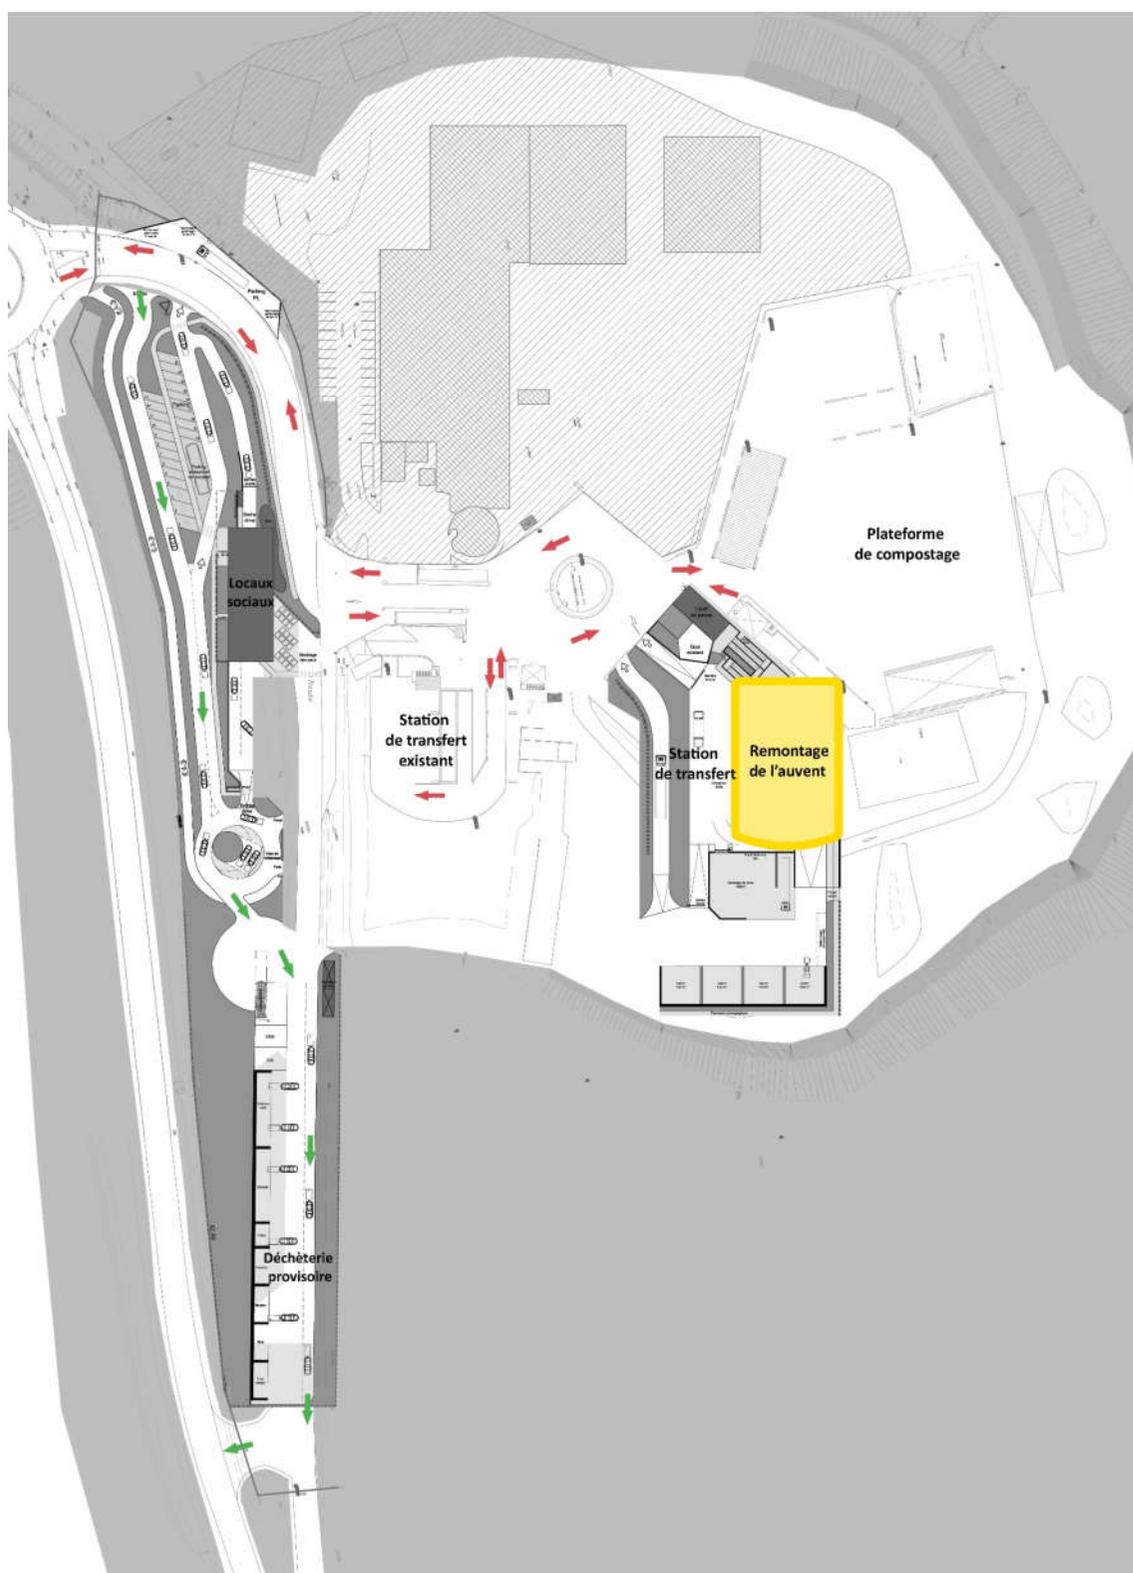


- Utilisation de la station de transfert existant,
- Fermeture de la station de transfert projet,
- Remontage de l'auvent de la station de transfert.



## Phase 3a

Durée des travaux : 1 mois

Mai 2024

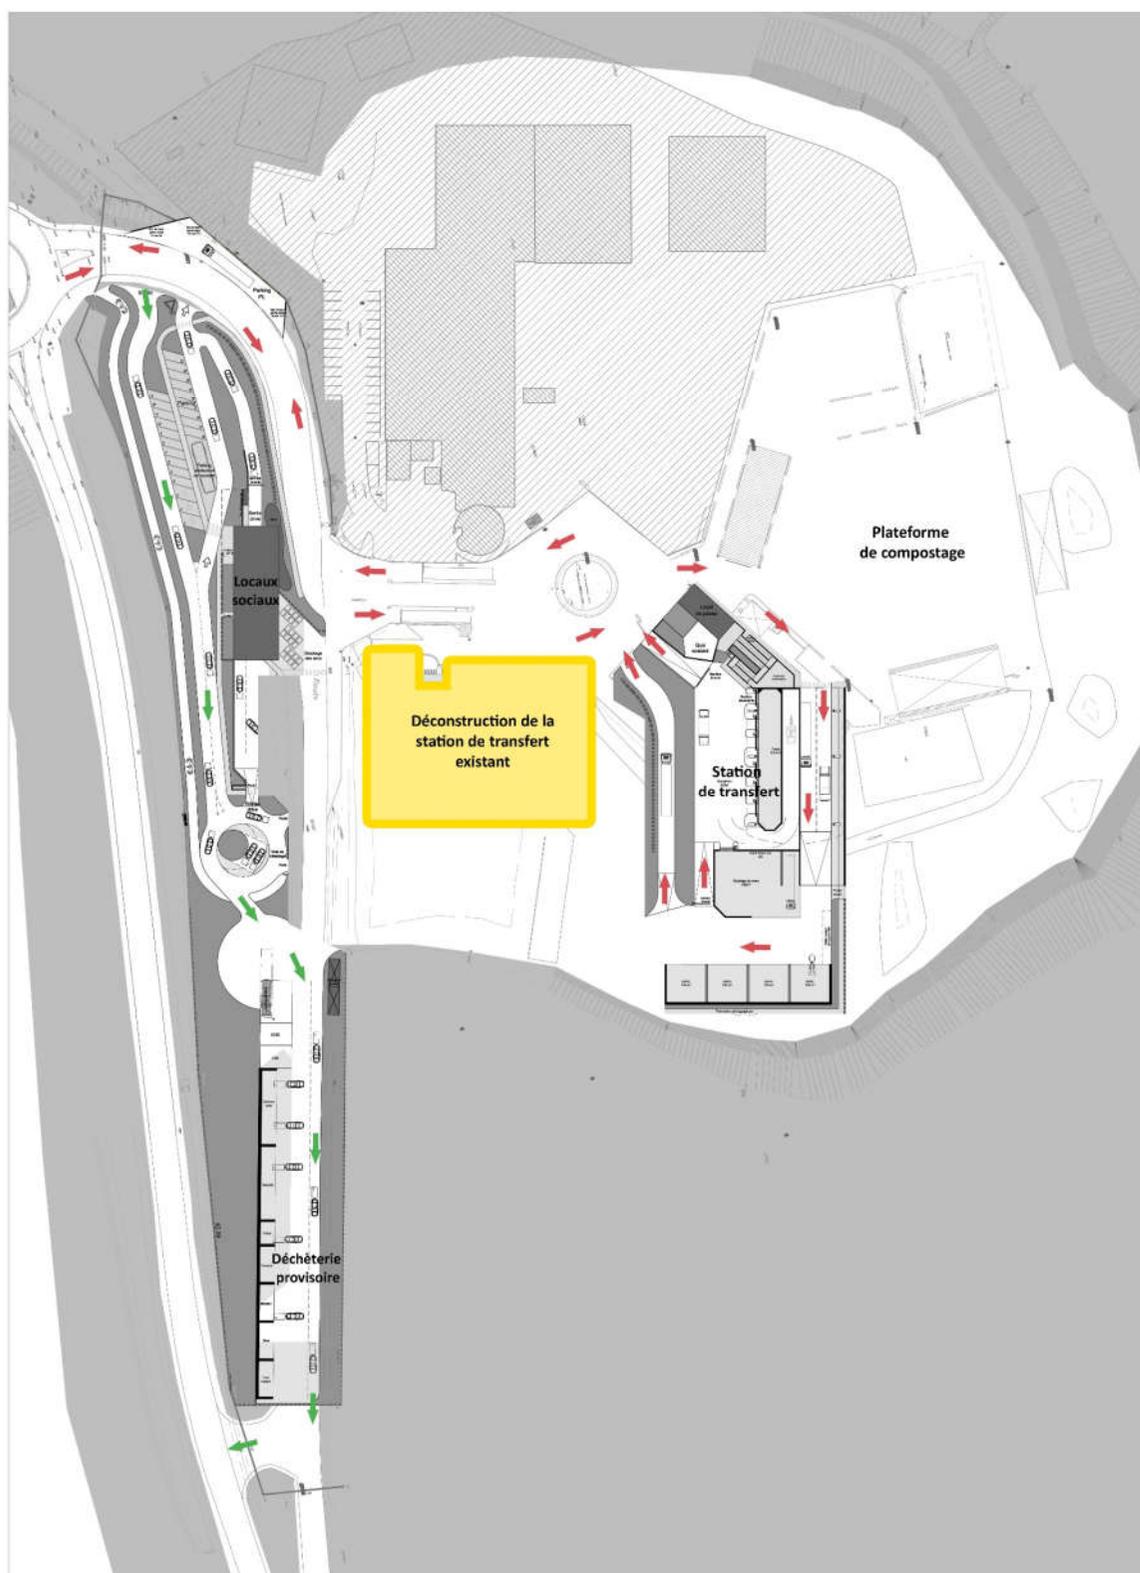


- Mise en service de la station de transfert projet,
- Déconstruction de la station de transfert existant.



## Phase 3b

Durée des travaux : 12 mois

Juin 2024 – Mai 2025

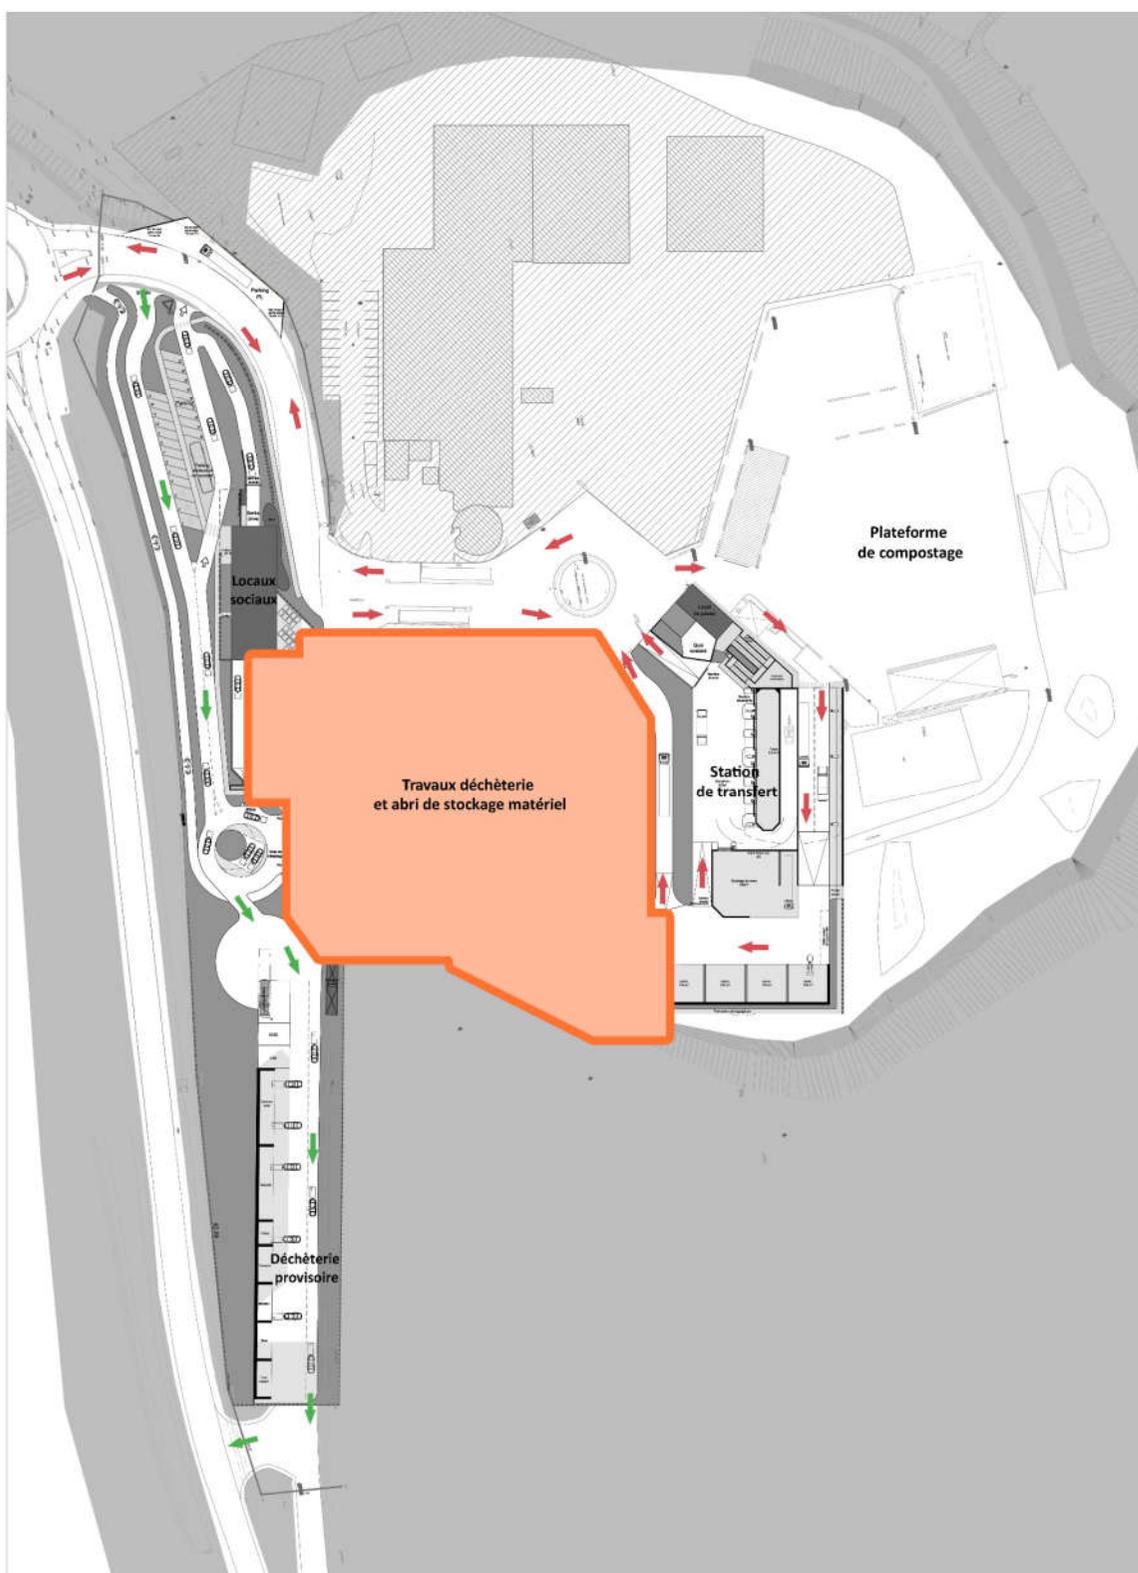


- Travaux déchèterie et abri de stockage matériel.



## Phase 4a

Durée des travaux : 4 mois

Juillet 2025 – Novembre 2025

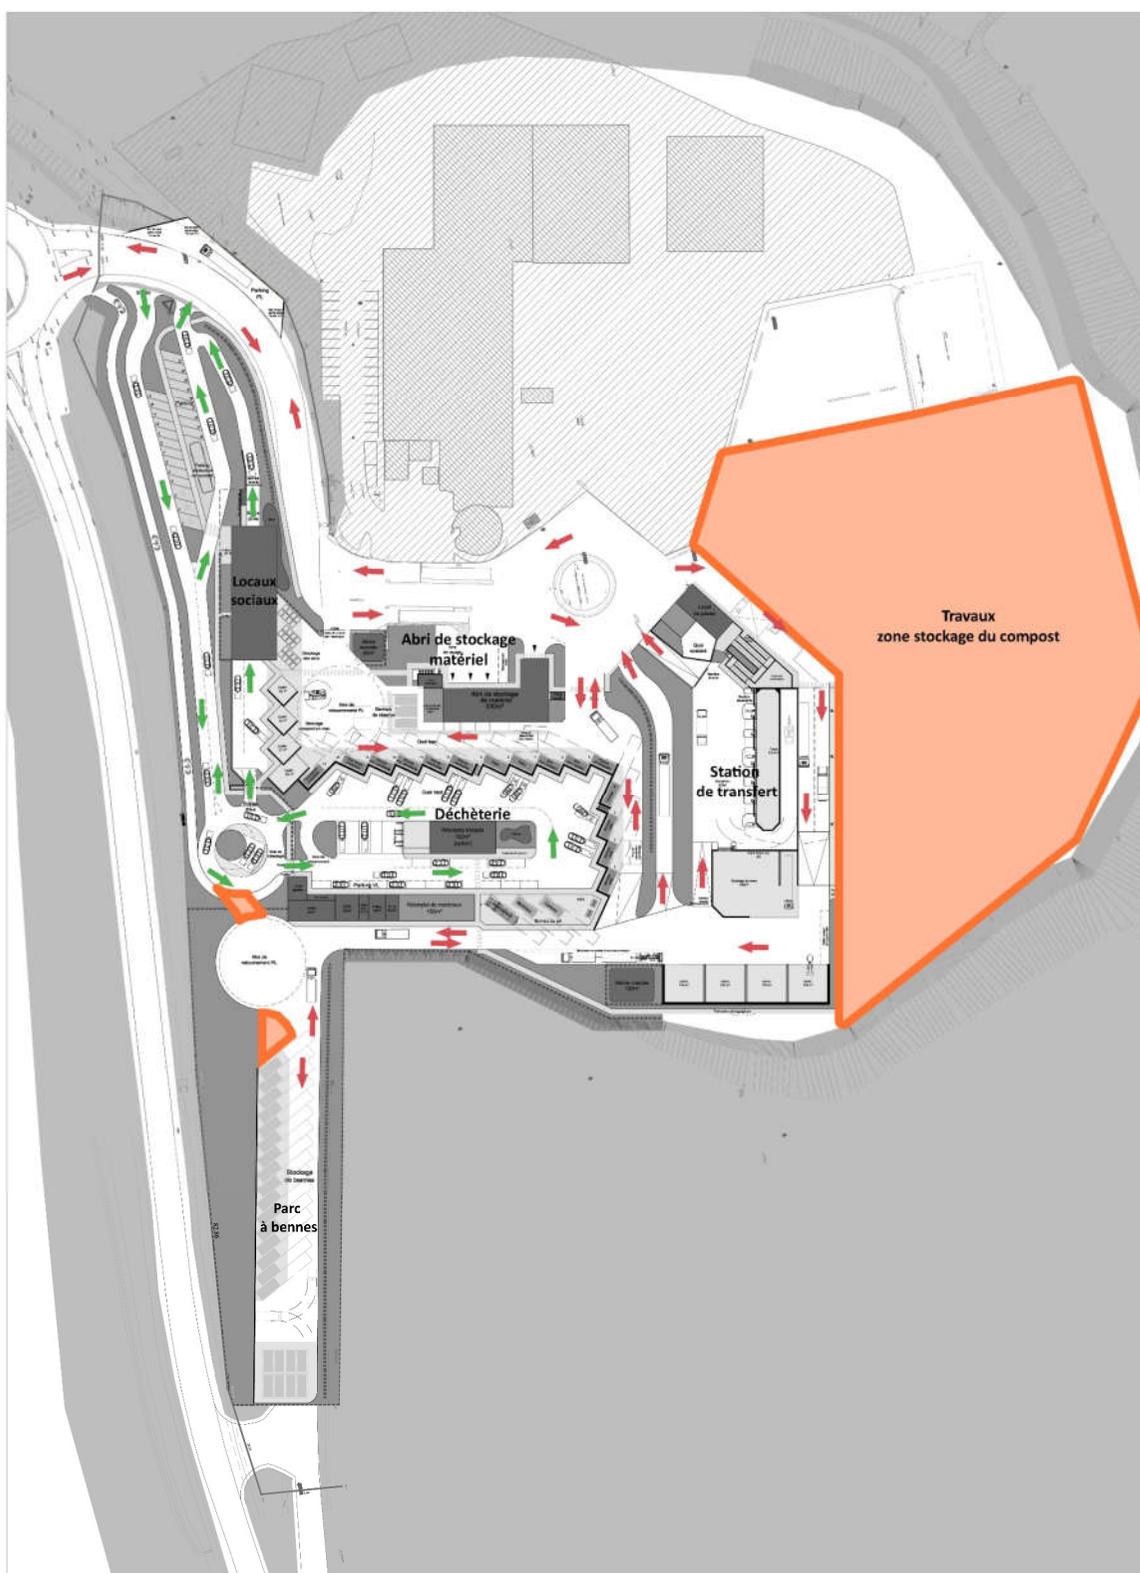


- Travaux zone de stockage du compost,
- Fermeture de la déchèterie provisoire,
- Mise en service de la déchèterie projet,
- Travaux voirie parc à bennes et accès déchèterie provisoire.



# Réception des travaux

## Décembre 2025

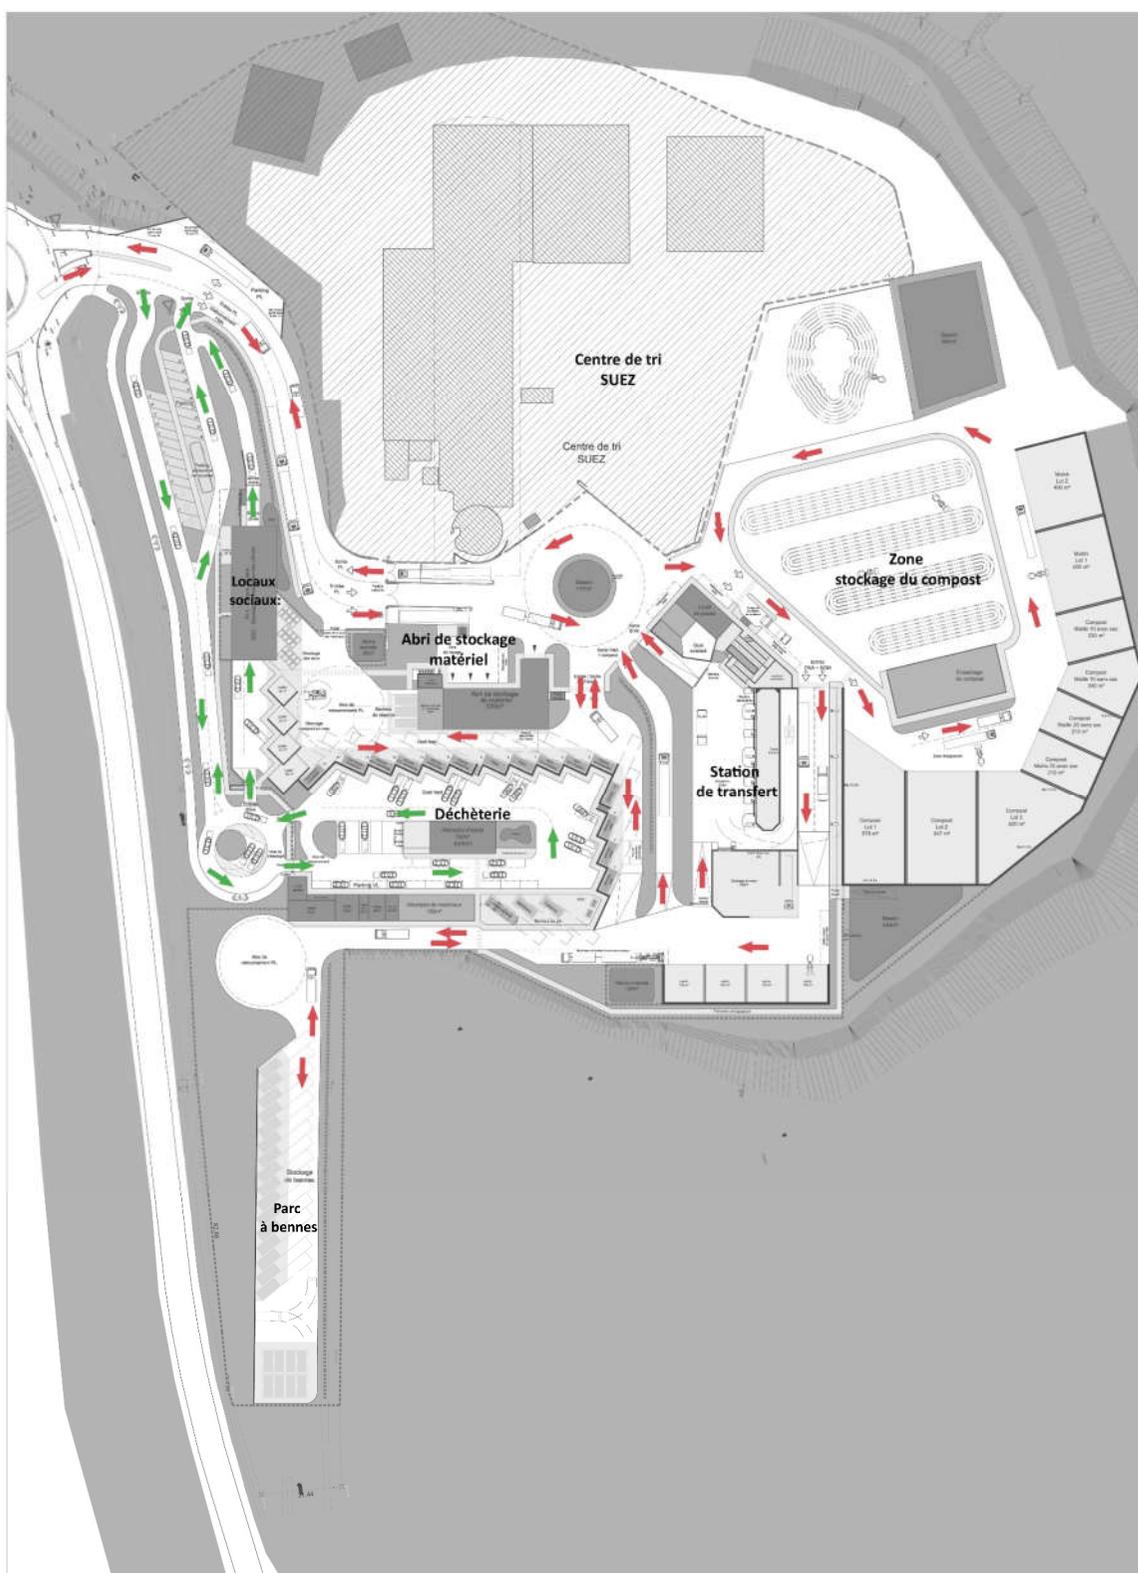

- Mise en service de la zone de stockage du compost.

← Accès VL  
← Accès PL
